

県道安達太良山線 舗装補修工事のお知らせ

この度、福島県県北建設事務所（二本松土木事務所）発注の県道安達太良山線舗装補修工事を弊社が施工することとなりました。

工事期間中は、**片側交互通行**や**夜間通行止め**等の交通規制を行います。

地域の皆様方には工事期間中何かとご不便・ご迷惑をおかけしますが、早期完成を目指し、1日も早く安全に安心してご利用できますよう鋭意努力致します。工事中は安全第一で施工致しますので、ご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。

尚、作業期間中は**道路に段差が生じます**ので走行の際は十分ご注意ください。工事に関しお築きの点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

記

工 事 名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
工 事 場 所	県道安達太良山線 二本松市不動平 地内 外 （裏面位置図を参考にしてください。）
工 事 期 間	令和5年4月3日～令和5年8月29日
作業実施期間	令和5年 7月10日～令和5年 7月25日（雨天順延あり） 午後19：00～午前4：00（夜間作業） 午前 8：30～午後5：00（昼間作業）
発 注 者	福島県県北建設事務所 二本松土木事務所業務課 監督員 菅野 直弥 TEL 0243-22-1151
受 注 者	株式会社 野 地 組 現場代理人 安齋 健人 TEL 0243-23-0131




↑ 至・二本松市内（起点）




↑ 至・塩沢（終点）

【現場位置図】

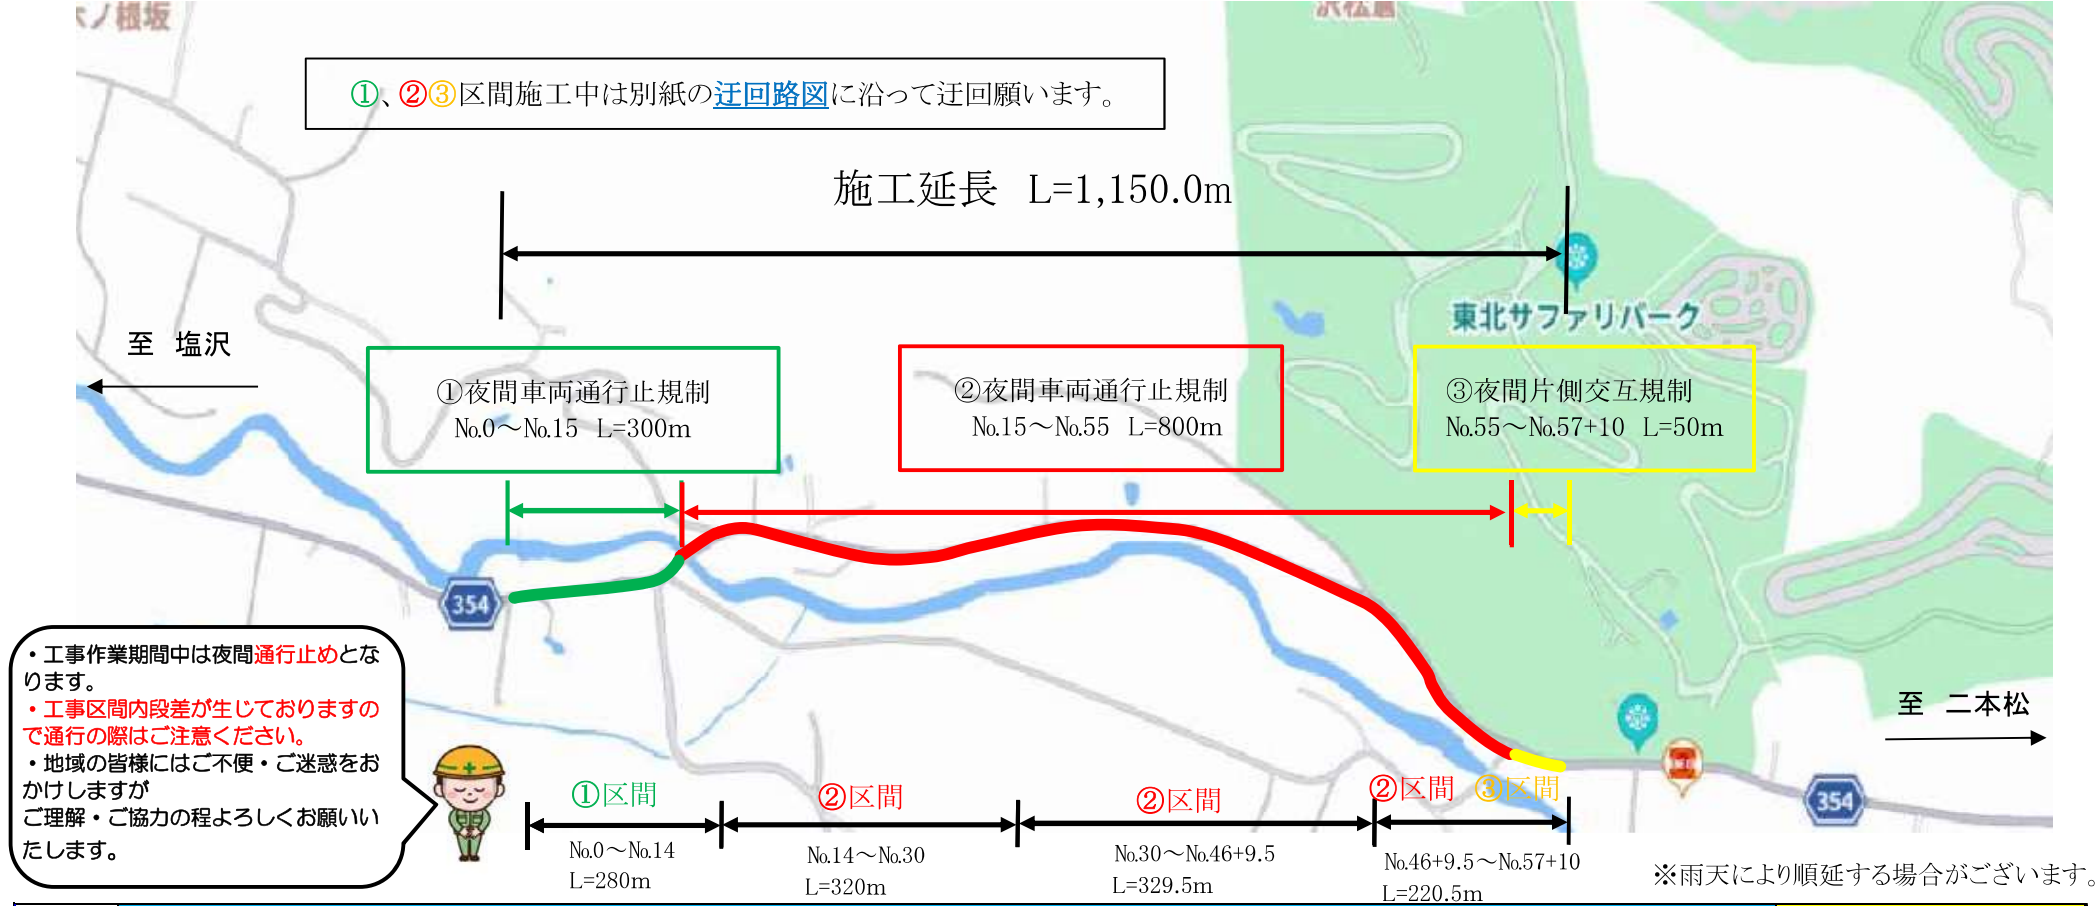

	夜 間 作 業														昼 間 作 業				
施工時間	午後19時 ～ 午前4時 通行止め規制														午前8時30分 ～ 午後17時 片側交互通行				
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
日付	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日
工種	切削	切削	表層	表層	予備日	休工		切削	切削	表層	表層	予備日	休工		予備日	予備日	区画線工	区画線工	出来形測定
数量	1637.5	1149.4	1149.4	1637.5				1481.4	1607.6	1607.6	1481.4								
施工区間	②区間	②区間 ③区間	②区間 ③区間	②区間				①区間	②区間	②区間	①区間								
No	46+9.5 ∩ 30	57+10 ∩ 46+9.5	57+10 ∩ 46+9.5	46+9.5 ∩ 30				0 ∩ 14	14 ∩ 30	14 ∩ 30	0 ∩ 14						0 57+10	0 57+10	0 57+10
施工延長	329.5m	220.5m	220.5m	329.5m				280m	320m	320m	280m						1150m	1150m	1150m

【①施工時 迂回路図】

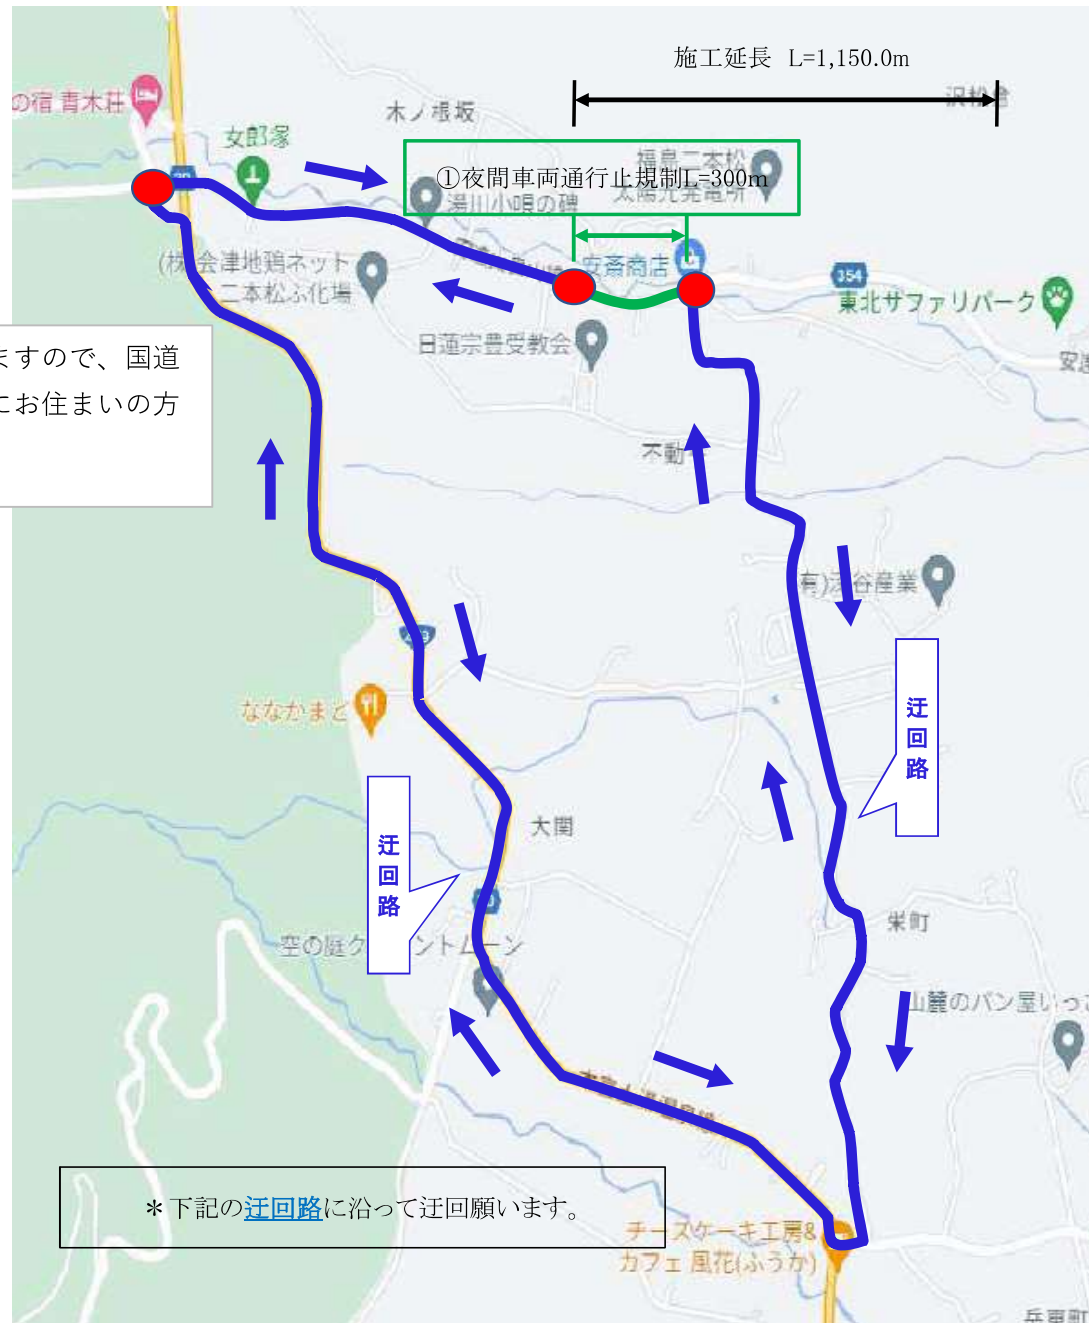

● 誘導員

【②③施工時 迂回路図】

